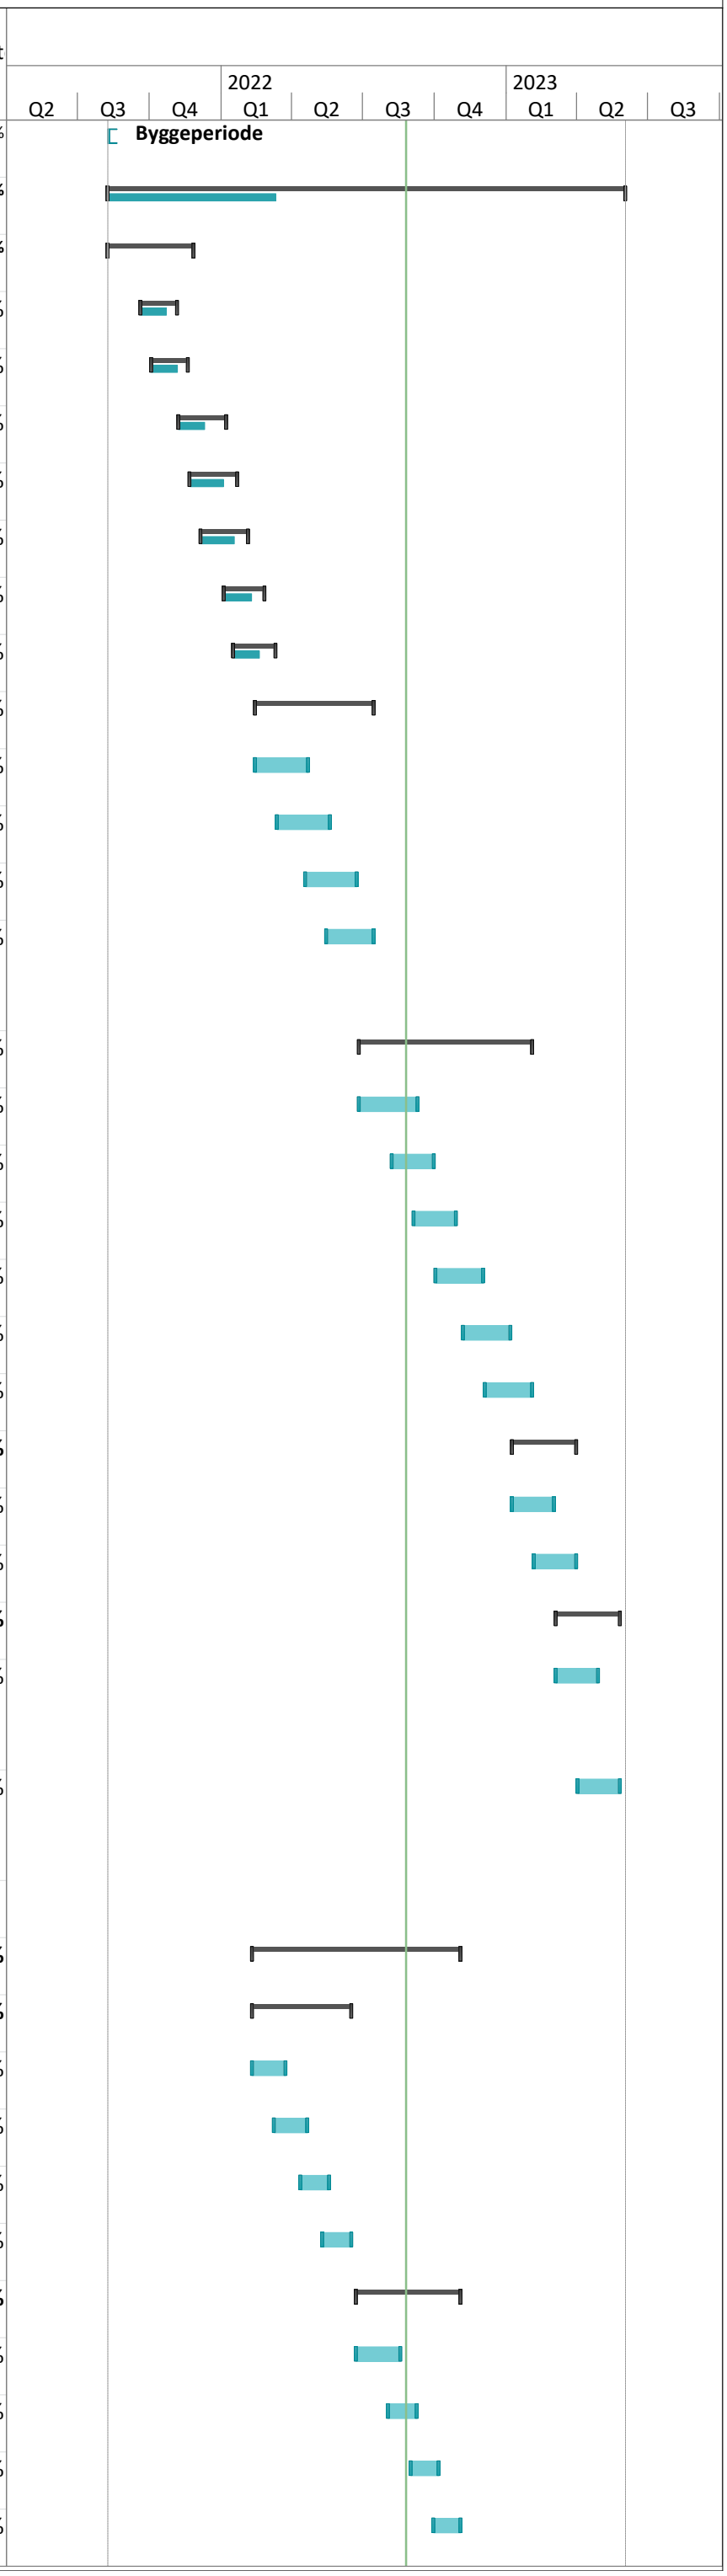ID	Task Mod	Opgavenavn	Duration	Start	Finish	Pre	% Work Complet
1		**Byggeperiode**		Mon 09-08-21			0%
2		**BLOK 3**	**449 days**	**Mon 09-08-21**	**Fri 02-06-23**		**0%**
3		**Etape 1**	**80 days**	**Mon 09-08-21**	**Fri 26-11-21**		**0%**
66		**Lejl. *135, 134, 164, 165, 193, 194**	35 days	**Mon 20-09-2**	**Fri 05-11-21**		0%
81		**Lejl. 135, 142,163,171, 192**	35 days	**Mon 04-10-2**	**Fri 19-11-21**		0%
96		**Lejl. *137, 136, 143, 162, 172, 191**	39 days	**Mon 08-11-2**	**Fri 07-01-22**		0%
111		**Lejl. (136), 137, 160, 161, 189, 190**	39 days	**Mon 22-11-2**	**Fri 21-01-22**		0%
126		**Lejl. *139, 138, 144, 159, 173, 188**	39 days	**Mon 06-12-2**	**Fri 04-02-22**		0%
141		**Lejl. (138), 139, 145, 158, 177, 187**	38 days	**Wed 05-01-2**	**Fri 25-02-22**		0%
156		**Lejl. (139), 156, 157, 185, 186**	40 days	**Mon 17-01-2**	**Fri 11-03-22**		0%
171		**BLOK 5**	110 days	**Mon 14-02-2**	**Fri 15-07-22**		0%
172		**RUL 7 lejl. 67,68,74,75,100,101,102,103,104,129,130,13**	50 days	**Mon 14-02-2**	**Fri 22-04-22**		0%
173		**RUL 8 lejl. 69,70,76,97,98,99,105,126,127,128**	50 days	**Mon 14-03-2**	**Fri 20-05-22**		0%
174		**RUL 9 lejl. 71,72,77,94,95,96,106,123,124,125**	48 days	**Tue 19-04-22**	**Thu 23-06-22**		0%
175		**RUL 10 lejl. 73,198,78,79,90,91,92,93,107,108,119,120,121,122**	45 days	**Mon 16-05-22**	**Fri 15-07-22**		0%
176		**BLOK 7**	140 days	**Mon 27-06-2**	**Fri 03-02-23**		0%
177		**RUL 11 Lejl. 1,2,9,10,35,36,37,38,39,64,65,66**	40 days	**Mon 27-06-2**	**Fri 09-09-22**		0%
178		**RUL 12 Lejl. 3,4,11,32,33,34,40,61,62,63**	40 days	**Mon 08-08-2**	**Fri 30-09-22**		0%
179		**RUL 13 Lejl. 5,6,12,29,30,31,41,58,59,60**	40 days	**Mon 05-09-2**	**Fri 28-10-22**		0%
180		**RUL 14 lejl. 7,8,13,14,25,26,27,28,42,43,54,55,56,57**	45 days	**Mon 03-10-2**	**Fri 02-12-22**		0%
181		**RUL 15 Lejl. 15,16,22,23,24,44,45,51,52,53**	40 days	**Mon 07-11-2**	**Fri 06-01-23**		0%
182		**RUL 16 lejl. 17,18,19,20,21,46,47,48,49,50**	40 days	**Mon 05-12-2**	**Fri 03-02-23**		0%
183		**Blok 5**	**60 days**	**Mon 09-01-2**	**Fri 31-03-23**		**0%**
184		**RUL 17 Lejl. 80,81,87,88,89,109,110,116,117,118**	40 days	**Mon 09-01-2**	**Fri 03-03-23**		0%
185		**RUL 18 Lejl. 82,83,84,85,86,111,112,113,114,115**	40 days	**Mon 06-02-2**	**Fri 31-03-23**		0%
186		**Blok 3**	**60 days**	**Mon 06-03-2**	**Fri 26-05-23**		**0%**
187		**RUL 19 Lejl. 146, 147, 153, 154, 155, 175, 176, 182, 183, 184**	40 days	Mon 06-03-23	Fri 28-04-23		0%
188		**RUL 20 Lejl. 148, 149, 150, 151, 152, 177, 178, 179, 180, 181**	40 days	Mon 03-04-23	Fri 26-05-23		0%
189							
190		**Genhusningstidsplan.**	**176 days**	**Thu 10-02-22**	**Thu 03-11-22**		**0%**
191		**Blok 5**	**91 days**	**Thu 10-02-22**	**Thu 16-06-22**		**0%**
192		lejl. 67 + 68	31 days	Thu 10-02-22	Thu 24-03-22		0%
193		lejl. 69 + 70	31 days	Thu 10-03-22	Thu 21-04-22		0%
194		lejl. 71 + 72	27 days	Wed 13-04-2	Thu 19-05-22		0%
195		lejl. 73 + 198	27 days	Wed 11-05-2	Thu 16-06-22		0%
196		**Blok 7**	**81 days**	**Thu 23-06-22**	**Thu 03-11-22**		**0%**
197		lejl. 1 + 2	26 days	Thu 23-06-22	Thu 18-08-22		0%
198		lejl. 3 + 4	25 days	Wed 03-08-2	Thu 08-09-22		0%
199		lejl. 5 + 6	26 days	Thu 01-09-22	Thu 06-10-22		0%
200		lejl. 7 + 8	25 days	Fri 30-09-22	Thu 03-11-22		0%
